

**DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA, NAYARIT.**

**OBSERVACIONES A LA OBRA: CONSTRUCCION DE
DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA
15 DE DICIEMBRE EN ZACUALPAN, NAYARIT.**



H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMPOSTELA, NAYARIT.



Dependencia	Presidencia Municipal
Sección	Contraloría Municipal
Oficio No.	XXXIX CONTRA/125/2015

Compostela, Nayarit; 30 de abril del 2015.

C.P. Alicia Monroy Lizola
Presidenta Municipal del H. XXXIX Ayuntamiento
Constitucional de Compostela, Nayarit.

Por medio del presente informo a usted el resultado de la revisión física de las siguientes obras:

- Construcción de aula didáctica 6.00 X 8.00 mts. estructura regional en preescolar "Luis Pasteur" en la localidad de la Peñita de Jaltemba.
- Rehabilitación de baños en escuela primaria Justo Sierra en la localidad de La Peñita de Jaltemba.
- Construcción de desayunador escolar en la escuela secundaria 15 de diciembre en la localidad de Zacualpan.

Y así mismo de los expedientes técnicos de las mismas, para ello le anexo las observaciones de cada uno de ellos.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

C.P. Felipe Chavarría Castañeda
Director de Contraloría y
Desarrollo Administrativo



COMPOSTELA
H. XXXIX AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE CONTRALORIA
Y DESARROLLO ADMVO.
COMPOSTELA, NAYARIT.

C.c.p. C.P. Alicia Monroy Lizola.-Presidenta Municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. – Para su conocimiento.

C.c.p. Profr. Ramiro Escobedo Aspe.-Síndico Municipal y Presidente de la Comisión de la Cuenta Pública.- Para su conocimiento.

c.c.p. Ing. Francisco. Zúñiga Ibarra. Secretario General del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. – Para su conocimiento.

C.c.p. C.P. Javier Trejo Peña.- Tesorero Municipal.- Para su conocimiento.

C.c.p.-Archivo.



VISITA DE OBRA

FECHA: 27/04/2015

OBIA: CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA 15 DE DICIEMBRE ZACUALPAN.


Se realizó la visita de obra por parte de la Contraloría Municipal del ayuntamiento de Compostela en la obra: "Construcción de desayunoador escolar secundaria 15 de diciembre zacualpan.", en la cual se hicieron observaciones en los siguientes conceptos cobrado y no ejecutados.

Suministro y colocación de mesas y bancas de concreto $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$, reforzado con acero del #3 a cada 15 cm. A cada lado con un espesor de 7cm. De color gris de 1.70 x 0.70 con dos bancas de 1.70 x 0.40 incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA	24	\$ 6,000.00	\$ 144,000.00
-----	----	-------------	---------------

OBSERVACIONES:

El mobiliario se encuentra en mal estado debido a la falta de vibrado y detalle en elemento de concreto, causando fisuramiento por mala adherencia de elementos de concreto.

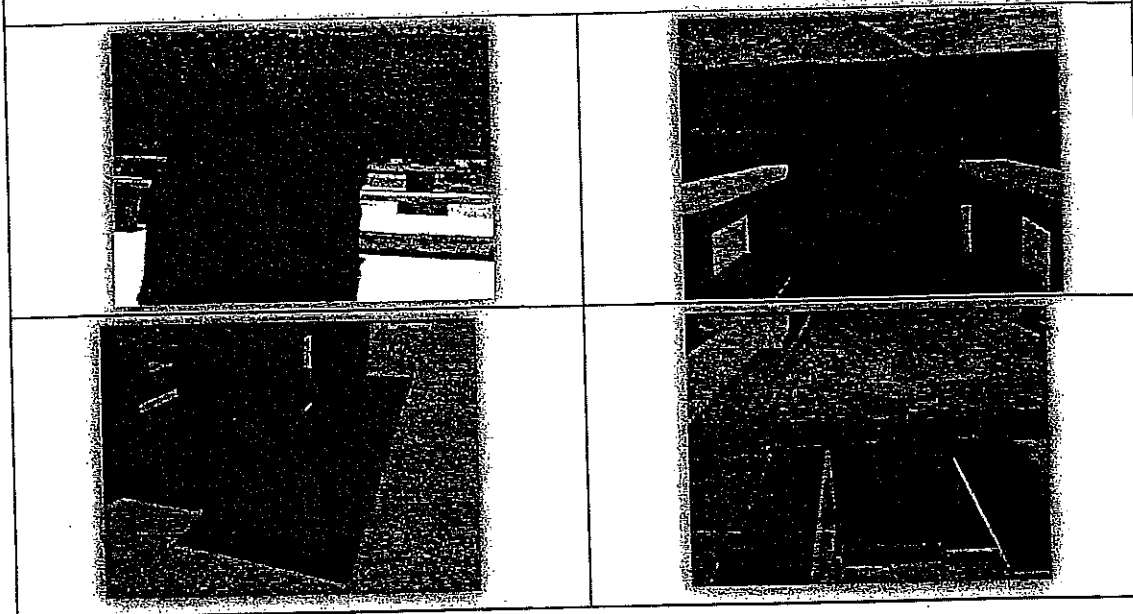

ATENTAMENTE

C.P. FELIPE CHAVARRIA CASTAÑEDA
DIRECTOR DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



H. XXXIX AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE CONTRALORIA
Y DESARROLLO ADMVO.

COMPOSTELA, NAYARIT.



VISITA DE OBRA

FECHA: 27/04/2015


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN PRESSCOLAR "LUIS PASTEUR" EN LA LOC. DE LA PEÑITA DE JALTEMBA.

Se realizó la visita de obra por parte de la Contraloria Municipal del ayuntamiento de Compostela en la obra: "Construcción de aula didáctica 6.00 x 8.00 mts estructura regional en presscolar "Luis Pasteur" en la loc. De la peñita de jaltemba.", en la cual se hicieron observaciones en los siguientes conceptos cobrado y no ejecutados.

()	ALBA-09	suministro y colocación de piso de loseta cerámica, prensada y esmaltada, tráfico pesado de 20x20 a 33x33 cm., de primera, asentada con pegapiso y boquilla de color de 6mm, de espesor marca interceramic y junteado con boquillas de 6mm de espesor.	M2	46.21	\$ 444.26	\$ 20,529.25
-----	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-----------	--------------

OBSERVACIONES:


La colocación de loseta cerámica no se encontró en sus optimas condiciones, ya que se encuentra un faltante de loseta cerámica en toda el área del zoclo y en el remate de terminación donde está la puerta principal.



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN PRESSCOLAR "LUIS PASTEUR" EN LA LOC. DE LA PEÑITA DE JALTEMBA.

ALBA-14	<p>suministro y colocación de sistema prefabricado impermeabilizante a base de multicapa y asfalto modificado SBS de 4mm. Con un mínimo de 12% de polimero con refuerzo central de fibra de vidrio de 90 gr/cm2 con resina termoadherida acabado aparente con gravilla y en color terracota y/o de acuerdo a especificaciones. garantía 8 años</p>	M2	76.32	\$ 189.55	\$ 14,466.46
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-----------	--------------


OBSERVACIONES:

<p>No coincide el concepto cobrado, con lo fisico mostrado en obra, debido a que no se encuentra la colocación del imperabilizante prefabricado.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------



HERR-01	<p>Fabricación y colocación de ventana de aluminio de 1.80 x 0.65 mts con canceleria de aluminio natural de 3 1/2" x 2" para cristal de 6mm.</p>	pza	1	\$ 5,670.82	\$ 5,670.82
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	-------------	-------------

OBSERVACIONES:

<p>El prototipo de ventana no coincide con las especificaciones de Capece que actualmente es Inife, debido a que la ventana actual es de 2 ventanas sin cristal templado y repison. Según especificaciones de Inife debe ser formada por cuatro ventanas de aluminio con cristal templado de 4mm. y repison.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------



VISITA DE OBRA


FECHA: 27/04/2015

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN PRESSCOLAR "LUIS PASTEUR" EN LA LOC. DE LA PEÑITA DE JALTEMBA.

HERR-03	suministro y colocación de protección tubular y estructural según croquis y especificaciones anexas, incluye: soldadura a placas fijas y pintura de esmalte anticorrosiva.	M2	11.9	\$ 1,086.33	\$ 12,927.33
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------	-------------	--------------

OBSERVACIONES:

No coincide el concepto cobrado, con lo físico mostrado en obra, debido a que no se encuentra la colocación de protección tubular y estructural en esta aula.

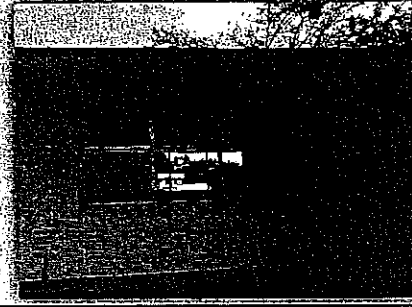

ATENTAMENTE

C.P. FELIPE CHAVARRIA CASTAÑEDA
DIRECTOR DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



COMPOSTELA
H. XXXIX AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE CONTRALORIA
Y DESARROLLO ADMVO.
COMPOSTELA, NAYARIT.



VISITA DE OBRA

FECHA: 27/04/2015


OBRA: REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA.

Se realizó la visita de obra por parte de la Contraloría Municipal del ayuntamiento de Compostela en la obra: "Rehabilitación de baños en escuela primaria justo sierra en la localidad de la peñita de jaltemba.", en la cual se hicieron observaciones en los siguientes conceptos cobrado y no ejecutados.



P02	Piso de cerámico (vitropiso) color arena de 33 x 33 cm., asentado con pegapiso maraca cemix color gris, boquilla sin arena color beige marca cemix, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	M2	69.1	\$ 247.70	\$ 17,116.07
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------	-----------	--------------


OBSERVACIONES:

La colocación de piso de cerámica (vitropiso) no se encontró en sus óptimas condiciones, ya que se encuentran varias piezas quebradas, también en el corte para el cespel tampoco está adecuadamente y los anchos de las juntas no es uniforme.	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------



P03	Suministro y colocación de azulejo cerámico color hueso de 20.1 x 30.19 cm, sobre aplanado, asentado con pega azulejo blanco marca cemix, boquilllex plus sin arena color almendra marca cemix, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	M2	165	\$ 220.30	\$ 36,349.50
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	-----------	--------------

OBSERVACIONES:

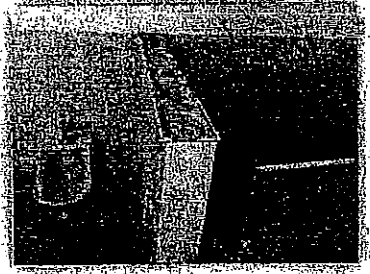La colocación de azulejo no se encontró en sus óptimas condiciones, debido a que se encontró un faltante de metros en el área de mamparas en la parte superior no se encuentran terminadas correctamente y en el área de los lavabos están mal perfilados los cortes del azulejo, los cuales pueden causar un accidente.	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------



VISITA DE OBRA

FECHA: 27/04/2015


OBRA: REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA.

No	Concepto	Unidad	Cantidad	Valor	Importe
----	----------	--------	----------	-------	---------

RE02	Aplanado acabado fino en plafon a base de mezcla yeso sellador vinilico berel, en espesor promedio de 2.2 cm, hasta 3.00 mts de altura, incluye desperdicio.	M2	65.32	\$ 103.87	\$ 6,784.79
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-----------	-------------

OBSERVACIONES:

El aplanado no fue aplicado correctamente, se esta fisurando y se han caido varias partes, ademas de no haber solucionado el problema de la filtración de agua en la losa, por tal motivo seguira callendose todo el aplanado.

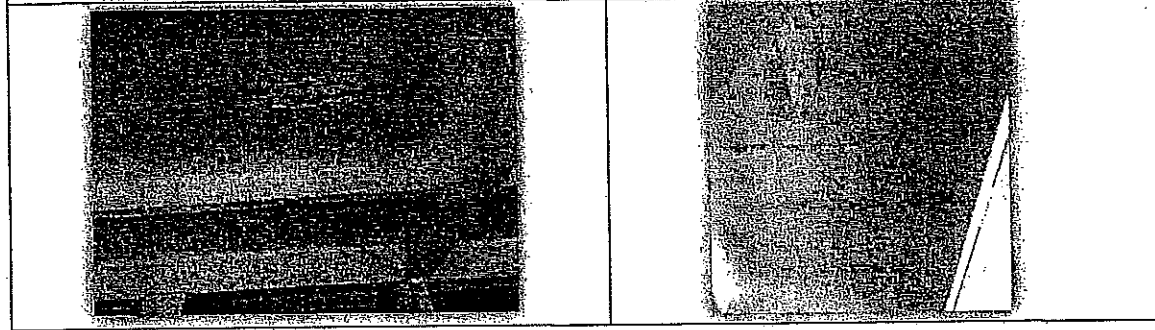


No	Concepto	Unidad	Cantidad	Valor	Importe
----	----------	--------	----------	-------	---------

RE03	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS A DOS MANOS, INCLUYE: 1 MANO DE SELLADOR, 2 MANOS DE PINTURA, LIMPIEZA DE REBABAS SE SELLARAN TODAS LAS FISURAS EN LOS APLANADOS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS PREVIO A LA COLOCACION DEL SELLADOR, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE L AREA DE TRABAJO INCLUYENDO PUERTAS Y VENTANAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	190.25	\$ 46.01	\$ 8,753.40
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	----------	-------------

OBSERVACIONES:

La aplicación de la pintura no esta colocada como lo dice el concepto cobrado, debido a que se ve deslavada la pintura y solo aparenta una sola mano.

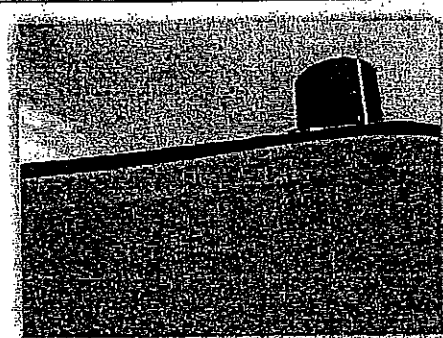



VISITA DE OBRA

FECHA: 27/04/2015

OBRA: REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA.

RE05 Suministro y aplicación de impermeabilizante integral de 4 años, M2 123 \$ 75.35 \$ 9,268.05
incluye: materiales y mano de obra.

OBSERVACIONES:


La utilización de este impermeabilizante no es el correcto, aunque sea remodelación se deben apegar a las especificaciones de Inife, por el motivo de que es una escuela primaria y se debió haber utilizado un impermeabilizante prefabricado a base de multicapa y asfalto modificado SBS de 4mm.



RE06 Suministro y aplicación pintura de aceite secado rápido en estructura metálica a dos manos, incluye: 2 manos de pintura, carga y acarreo dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. M2 27 \$ 165.48 \$ 4,467.96

OBSERVACIONES:

La aplicación de esta pintura no se encuentra en las optimas condiciones, debido a que se esta despegando y dejando las estructuras sin protección.





VISITA DE OBRA


FECHA: 27/04/2015

OBRA: REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA.

RE07	Construcción de gotero en loza a base de mezcla cemento-arena 1:5 de proporción, en espesor promedio de 2.2 cm, hasta 3.00 mts de altura, incluye: desperdicio, materiales, mano de obra y herramienta.	ML	26	\$ 119.50	\$ 3,107.00
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	-----------	-------------

OBSERVACIONES:


La construcción del gotero no fue realizada en la loza, ocasionando mas filtracion a los baños. Además de que el perfil de losa y el ancho del acabado del perfil no miden lo mismo.



IN03	Suministro e instalación de salida de apagador, incluye poliducto naranja reforzado, caja galvanizada, cable no. 12, placa de plástico marca quinziño o similar, ranurado, resane de albañilería, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	6	\$ 283.40	\$ 1,700.40
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	-----------	-------------

OBSERVACIONES:

La instalación de apagadores no fue exactamente la correcta, ya que encontramos uno en el la losa un lugar nada adecuado para su uso, además de no usar canaleta para la protección y estética del cable.

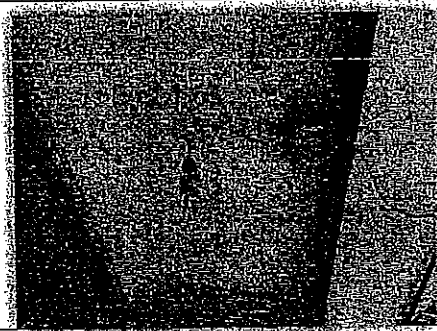




VISITA DE OBRA

FECHA: 27/04/2015

OBRA: REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA.


IN04	Suministro e instalación de lámpara slím de 2x60, incluye: balastra de 2x60, cable no. 12, placa de plástico marava quinzifio o similar, ranurado, resane de albañilería, limpieza, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	8	\$ 601.62	\$ 4,812.96
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	-----------	-------------

OBSERVACIONES:
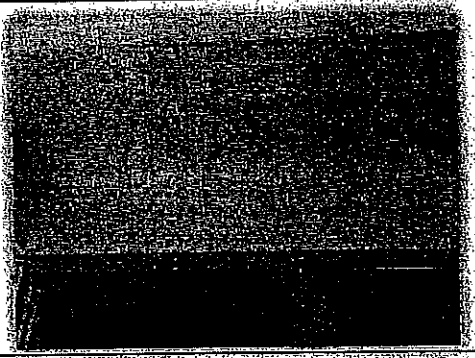
<p>En la revisión de las lámparas notamos que no todas son nuevas, varias son reutilizadas de las que ya existían.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CANCE-4	Fabricación y colocación de ventana de aluminio de 1.80 x 0.65 mts con cancelería de aluminio natural de 3 1/2" x 2" para cristal de 6mm.	PZA	3	\$ 1,648.04	\$ 4,944.12
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	-------------	-------------

OBSERVACIONES:

<p>La colocación de la ventana si se encuentra pero ninguna tiene el cristal de 6 mm, además que no cumple con las especificaciones de Inife que debe ser cristal templado de 4mm.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------



VISITA DE OBRA


FECHA: 27/04/2015

OBRA: REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA.



CANCE-8	Fabricación y colocación de mamparas de duela de aluminio natural de 1.50 x 0.95 mts con canceleria de aluminio natural de 1/2" x 2".	PZA	12	\$ 3,867.45	\$ 46,409.40
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	-------------	--------------


OBSERVACIONES:

<p>Solo se encuentran colocadas 6 mamparas en total dos módulos de baños no tienen ninguna, no se tomó correctamente la fotografía debido a que tenían cerrado los módulos y la directora no tenía llave, solo pudimos ver por la ventana.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------



CANCE-9	Fabricación y colocación de mamparas para migitorio de duela de aluminio natural con canceleria de cuadrado de 1/2".	PZA	4	\$ 1,320.78	\$ 5,283.12
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	-------------	-------------

OBSERVACIONES:
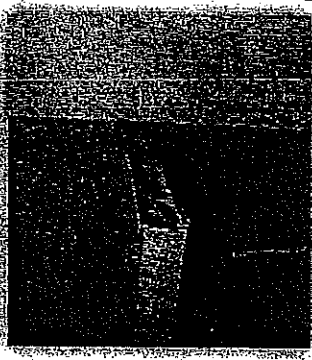
<p>No existe ninguna mampara en el área de migitorios.</p>	
------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------



VISITA DE OBRA


FECHA: 27/04/2015

OBRA: REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA.

LIMP-1	Limpieza general de toda la obra para su recepción y ocupación comprende todos los materiales necesarios , recolección de basura y su acarreo fuera de la obra donde lo indique la supervisión, incluye: uso de espátulas, detergente en polvo, franelas, recogedores, trapeadores, estropajo, cloro, acido muriatico, equipo, herramienta, mano de obra, así como cualquier otro elemento necesario para su correcta ejecución de p.u.o.f.	LOTE	1	\$ 3,062.42	\$ 3,062.42
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	-------------	-------------

OBSERVACIONES:

La limpieza no fue ejecutada, dejando todo dentro de la escuela dandole mal aspecto y cobrando un concepto no ejecutado

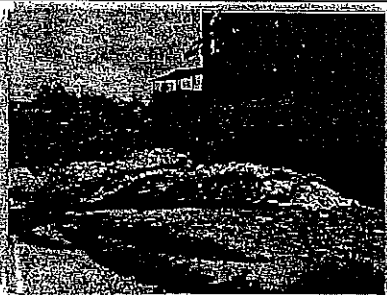

NOTAS: Los directores del plantel Escuela Primaria Justo Sierra en la localidad de la Peñita de Jaltemba, reportan que el contratista sustrajo 6 (seis) puertas de aluminio que retiraron de los baños y una carretilla y hasta la fecha desconocen el destino de ellos, por lo cual solicitan sean reintegrados al plantel.

ATENTAMENTE

C.P. FELIPE CHAVARRIA CASTAÑEDA
DIRECTOR DE CONTRALORIA y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



H. XXXIX AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE CONTRALORIA
Y DESARROLLO ADMVO.
COMPOSTELA, NAYARIT.



**DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA, NAYARIT.**

**OBSERVACIONES A LA OBRA:CONTRUCCION DE
DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO
OBREGON EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN,
NAYARIT.**


TEPIC, NAYARIT A 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

C. C.P. FELIPE CHAVARRIA CASTAÑEDA
CONTRALOR MUNICIPAL.
PRESENTE

CON/ ATENCION
C. LIC. PAVEL CAMELO AVEDOY
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
MUNICIPAL DE COMPOSTELA, NAYARIT.

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO SE HACEN LAS OBSERVACIONES PARA LA LIBERACIÓN DE ESTIMACIONES DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT", CON No. DE CONTRATO: FISM-SD-PD-2015-012-I

OBSERVACIONES

- 
1. DE ACUERDO AL CONCEPTO COBRADO EN ESTIMACIÓN **REPOSICIÓN DE BANQUETA** MENCIONADA EN EL CATÁLOGO DE OBRA, NO COINCIDE EN SITIO DE OBRA EL NUMERO COBRADO CON EL EJECUTADO, SE COBRA EN ESTIMACIÓN **6 PZAS** Y SOLO EXISTEN **3 PZAS**, DE TAL MANERA ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL SOLICITA AL CONTRATISTA EL AJUSTE EN ESTIMACIÓN O LA JUSTIFICACIÓN DE DICHO CONCEPTO.
 2. DE ACUERDO AL CONCEPTO COBRADO EN ESTIMACIÓN **CORTE CON DISCO EN BANQUETA** MENCIONADA EN EL CATÁLOGO DE OBRA, NO COINCIDE EN SITIO DE OBRA EL NUMERO COBRADO CON EL EJECUTADO, SE COBRA EN ESTIMACIÓN **6 PZAS** Y SOLO EXISTEN **5 PZAS**, DE TAL MANERA ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL SOLICITA AL CONTRATISTA EL AJUSTE EN ESTIMACIÓN O LA JUSTIFICACIÓN DE DICHO CONCEPTO.
 3. DE ACUERDO AL CONCEPTO COBRADO EN ESTIMACIÓN **RUPTURA DE BANQUETA** MENCIONADA EN EL CATÁLOGO DE OBRA, NO COINCIDE EN SITIO DE OBRA EL NUMERO COBRADO CON EL

EJECUTADO, SE COBRA EN ESTIMACIÓN **6 PZAS** Y SOLO EXISTEN **5 PZAS**, DE TAL MANERA ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL SOLICITA AL CONTRATISTA EL AJUSTE EN ESTIMACIÓN O LA JUSTIFICACIÓN DE DICHO CONCEPTO.

4. NO SE HAN PRESENTO LAS PRUEBA PROCTOR DE DICHA OBRA, LA CUAL VIENE COBRADA EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y. HASTA EL MOMENTO NO SE HA JUSTIFICADO EL MEDIO POR EL CUAL SE LLEVÓ ACABO LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPACTACIÓN EN CEPA.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, QUEDANDO A SUS PARECIABLES ORDENES

ATENTAMENTE



ARQ. ARACELI JOCELYN CASTELLANOS GONZALEZ

AUDITOR DE O BRA

