



# AVANCE FISICO – FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA 2023

**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS





**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
(FAISMUN)**

No	OBRA	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (INC. I.V.A.)	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA
4	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	FAISMUN-APO-OP-2023-004-AD	\$ 1'503,172.64	SAN ISIDRO	AGUA POTABLE
5	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO Y PUENTE VEHICULAR A PANTEÓN REGIONAL DE LA LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA	FAISMUN-URB-OP-2023-005-I	\$ 2'574,683.95	BELLA UNIÓN	PUENTE VEHICULAR
6	REHABILITACIONES DE CANCHAS PÚBLICAS DE FUTBOL RÁPIDO EN LAS LOCALIDADES DE LAS VARAS, FELIPE CARRILLO PUERTO Y COMPOSTELA, NAYARIT.	FAISMUN-URB-OP-2023-006-I	\$ 1'995,227.62	LAS VARAS, COMPOSTELA, FELIPE CARRILO PUERTO	CANCHA DE FUTBOL
7	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLES, EN BARRIO ATENAS DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS.	FAISMUN-URB-OP-2023-007-I	\$ 4'194,105.64	LAS VARAS	CANCHA USOS MULTIPLES
8	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IXTLÁN LAS CAÑADAS.	FAISMUN-SALUD-OP-2023-008-AD	\$ 694,474.57	NUEVO IXTLAN (LAS CAÑADAS)	DISPENSARIO MEDICO
9	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE TEPIQUEÑOS	FAISMUN-URB-OP-2023-009-I	\$ 2'590,977.62	TEPIQUEÑOS	PLAZA CIVICA
10	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE LA LIMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	FAISMUN-URB-OP-2023-010-AD	\$ 522,489.15	PUERTA DE LA LIMA	PLAZA CIVICA



**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
(FAISMUN)**

No	OBRA	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (INC. I.V.A.)	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA
12	REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, DE LA COLONIA AVIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT.	FAISMUN-URB-OP-2023-012-AD	\$ 818,453.78	COMPOSTELA	AGUA POTABLE
13	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL BETEL EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE GUAYABITOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT; REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE GENERAL SÓSTENES ROCHA Y CALLE L.G. NAVARRO EN COLONIA ESTADIOS, DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	FAISMUN-DRE-OP-2023-013-I	\$ 2'703,121.49	RINCON DE GUAYABITOS, COMPOSTELA	DRENAJE SANITARIO
14	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA LAS FUENTES EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	FAISMUN-URB-OP-2023-014-AD	\$ 1'109,803.76	LAS VARAS	PLAZA PUBLICA
15	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y SALIDA A CERRO PELÓN EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	FAISMUN-URB-OP-2023-015-I	\$ 3'098,597.57	CARRILLO PUERTO	CANCHA USOS MULTIPLES



**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
(FAISMUN)**

No	OBRA	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (INC. I.V.A.)	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA
16	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE GENERAL RAFAEL BUELNA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA AGUA AZUL EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	FAISMUN-URB-OP-2023-016-I	\$ 3'780,860.67	LAS VARAS	EMPEDRADO AHOGADO
17	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	FAISMUN-APO-OP-2023-017-I	\$ 1'739,381.05	PARAISO ESCONDIDO	AGUA POTABLE
18	CONSTRUCCIÓN DE 5 CASSETAS DE CLORACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ÚRSULO GALVÁN, MIRAVALLES, LAS PIEDRAS, LA PEÑITA DE JALTEMBA Y ALTAVISTA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	FAISMUN-APO-OP-2023-018-AD	\$ 870,252.91	ÚRSULO GALVÁN, MIRAVALLES, LAS PIEDRAS, LA PEÑITA DE JALTEMBA Y6 ALTAVISTA	CASETA DE CLORACIÓN
19	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	FAISMUN-URB-OP-2023-019-AD	\$ 445,918.63	ZAPOTAN	VADO
20	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT.	FAISMUN-ELE-OP-2023-020-AD	\$ 532,977.35	COMPOSTELA	ELECTRIFICACIÓN
21	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE DICIEMBRE ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE LAURELES Y GÓNGORA EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN	FAISMUN-DRE-OP-2023-021-I	\$ 1'719,110.89	ZACUALPAN	DRENAJE SANITARIO





**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
(FAISMUN)**

No	OBRA	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (INC. I.V.A.)	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA
22	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO ASFALTICO EN CALLE 8 ENTRE HIDALGO Y ALDAMA, CALLE 7 ENTRE HIDALGO Y ZARAGOZA, CALLE LEANDRO VALLE ENTRE ZARAGOZA Y ALDAMA, CALLE ALDAMA ENTRE MINA Y BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA.	FAISMUN-URB-OP-2023-022-I	\$ 3'137,021.73	COMPOSTELA	PAVIMENTO
23	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MONTERREY ENTRE TULE Y FRANCISCO I MADERO, CHIHUAHUA ENTRE HIGUERAS Y TULE, AMAPA ENTRE HIGUERAS Y TULE, TULE ENTRE OCEANO PACIFICO Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, EBANO ENTRE OCEANO PACIFICO Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, LAZARO CARDENAS ENTRE MONTERREY Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, FRANCISCO I MADERO ENTRE OCEANO PACIFICO Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO	FAISMUN-DRE-OP-2023-023-I	\$ 3'150,778.30	PARAISO ESCONDIDO	DRENAJE SANITARIO
24	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MICHOACAN ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE INDUSTRIAL EN COLONIA SAN JOSÉ DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT.	FAISMUN-URB-OP-2023-024-AD	\$ 1'277,391.01	LAS VARAS	EMPEDRADO AHOGADO
25	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE LÁZARO CARDENAS BAJADA AL ARROYO PARA PASAR A LA COLONIA LAS BORREGAS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	FAISMUN-URB-OP-2023-025-AD	\$ 299,423.14	ZAPOTAN	EMPEDRADO AHOGADO





**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
(FAISMUN)**

**2023**

**MONTO TOTAL CONTRADADO  
(I.V.A. INCLUIDO)**

**\$ 39'680,398.05**

***(TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y  
OCHO PESOS 05/100 M.N.)***

TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



AVANCE FISICO - FINANCIERO


OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT."

No. CONTRATO FAISMUN-APD-OP-2023-004-AD

MONTO DE CONTRATO \$ 1,503,172.64


AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	100%
POR EJERCER	0%

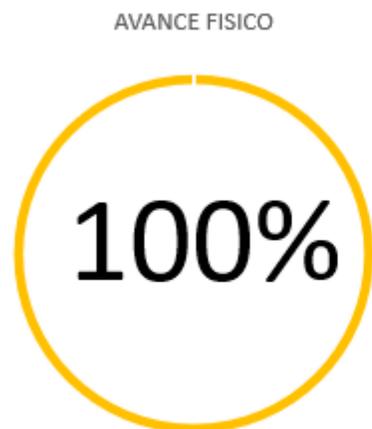

AVANCE FINANCIERO

			%
EJECUTADO PAGADO	\$	1,503,172.64	100%
POR COBRAR	\$	-	0%

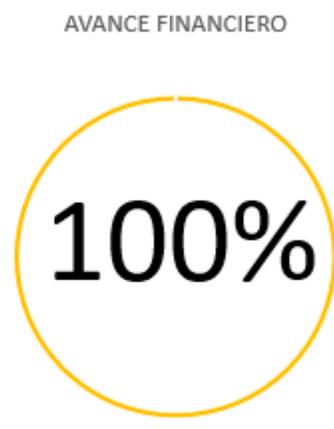



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

**REPORTE FOTOGRAFICO**



AVANZANDO  
**hoy**  
AVANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

## REPORTE FOTOGRAFICO



MAJANDO  
**Antigo**  
AVANZAMOS



AVANCE FISICO - FINANCIERO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO Y PUENTE VEHICULAR A PANTEÓN REGIONAL DE LA LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA."


No. CONTRATO FAISMUN-URB-OP-2023-005-I

MONTO DE CONTRATO	\$	2,574,683.95
AMPLIACION	\$	491,661.01
MONTO TOTAL	\$	3,066,344.96

AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	100%
POR EJERCER	0%

AVANCE FISICO

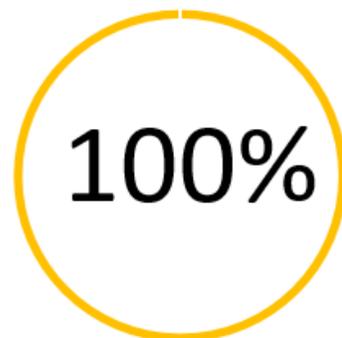

■ AVANCE ACTUAL ■ POR EJERCER

AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ 2,574,683.95	100%
POR COBRAR	\$ -	0%

AVANCE FINANCIERO



■ EJECUTADO PAGADO ■ POR COBRAR



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

## REPORTE FOTOGRAFICO





**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

**REPORTE FOTOGRAFICO**





AVANCE FISICO - FINANCIERO


OBRA: "REHABILITACIONES DE CANCHAS PÚBLICAS DE FUTBOL RÁPIDO EN LAS LOCALIDADES DE LAS VARAS, FELIPE CARRILLO PUERTO Y COMPOSTELA, NAYARIT."

No. CONTRATO FAISMUN-URB-OP-2023-006-I

MONTO DE CONTRATO \$ 1,995,227.62


AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	89%
POR EJERCER	11%

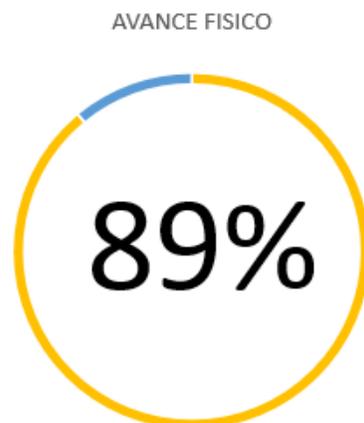

AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ -	0%
POR COBRAR	\$ 1,995,227.62	100%

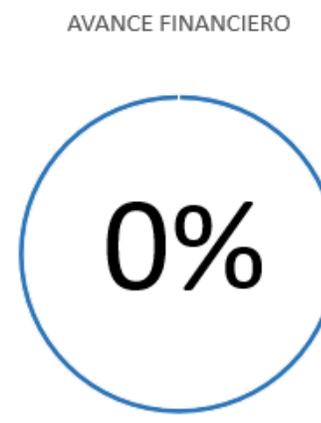



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO

REHABILITACIÓN DE CANCHA COL. CELSO HERNANDEZ, LAS VARAS.



RABAJANDO  
**ontigo**  
N Z A M O S



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO

REHABILITACIÓN DE CANCHA UNIDAD DEPORTIVA, COMPOSTELA.



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO

REHABILITACIÓN DE CANCHA CARRILLO PUERTO, COMPOSTELA.



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



AVANCE FISICO - FINANCIERO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLES, EN BARRIO ATENAS DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS."

No. CONTRATO	FAISMUN-URB-OP-2023-007-I
--------------	---------------------------

MONTO DE CONTRATO	\$	4,194,105.64
AMPLIACIÓN	\$	315,237.70
TOTAL	\$	4,509,343.34


AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	100%
POR EJERCER	0%



AVANCE FINANCIERO

			%
EJECUTADO PAGADO	\$	4,509,343.34	100%
POR COBRAR	\$	-	0%

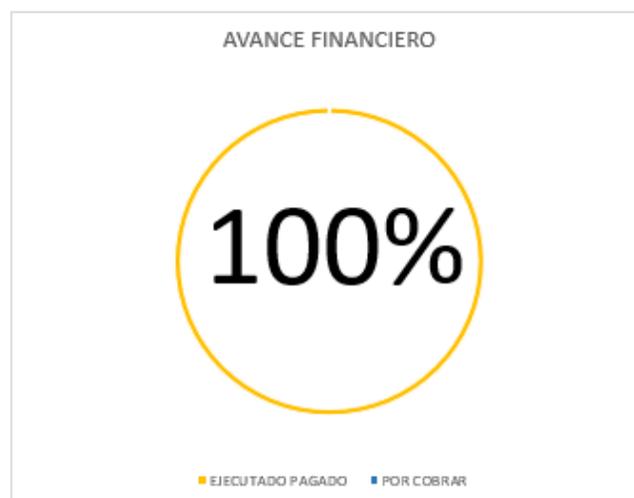



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**ontigo**  
EN ZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

## REPORTE FOTOGRAFICO





**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS




**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO

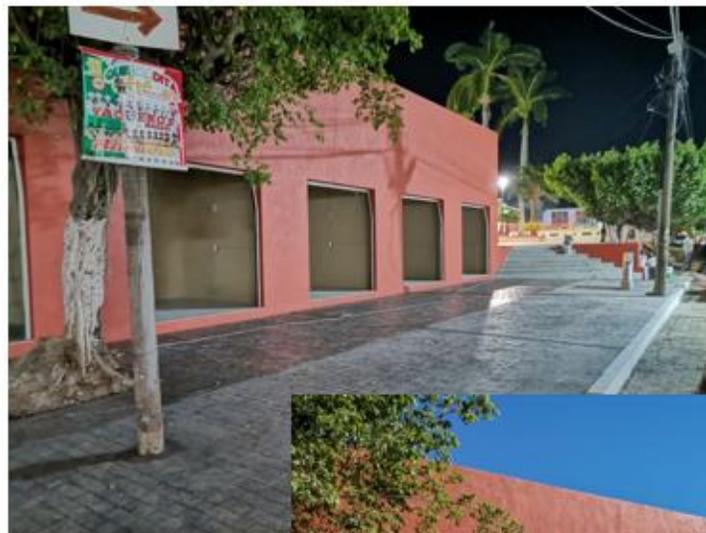

RABAJANDO  
**ontigo**  
AVANZAMOS



AVANCE FISICO - FINANCIERO


OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IXTLÁN LAS CAÑADAS."

No. CONTRATO FAISMUN-SALUD-OP-2023-008-AD

MONTO DE CONTRATO \$ 694,474.57


AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	100%
POR EJERCER	0%

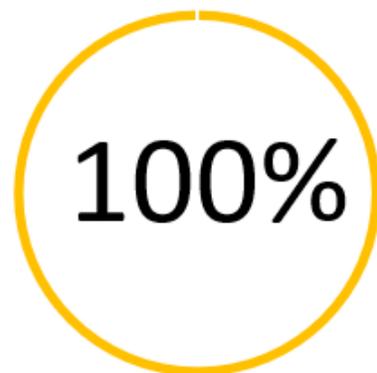

AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ 694,474.57	100%
POR COBRAR	\$ -	0%

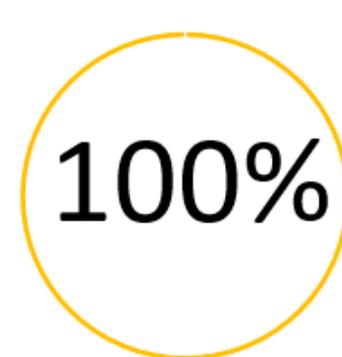



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

**REPORTE FOTOGRAFICO**



**JANDO**  
**tigo**



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO





AVANCE FISICO - FINANCIERO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE TEPIQUEÑOS."


No. CONTRATO FAISMUN-URB-OP-2023-009-I

MONTO DE CONTRATO \$ 2,590,977.62

AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	30%
POR EJERCER	70%

AVANCE FISICO

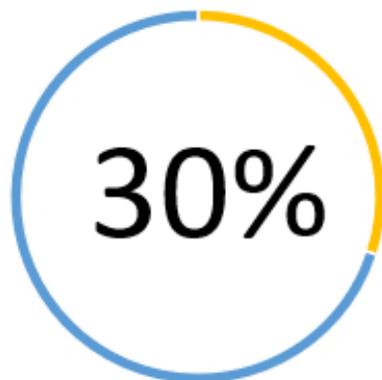


■ AVANCE ACTUAL ■ POR EJERCER

AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ 318,516.80	12%
POR COBRAR	\$ 2,272,460.82	88%

AVANCE FINANCIERO

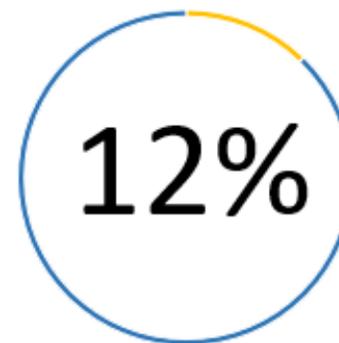

■ EJECUTADO PAGADO ■ POR COBRAR



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



AVANCE FISICO - FINANCIERO

OBRA: "REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE LA LIMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT."

No. CONTRATO FAISMUN-URB-OP-2023-010-AD

MONTO DE CONTRATO \$ 522,489.15

AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	100%
POR EJERCER	0%



AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ 522,489.15	100%
POR COBRAR	\$ -	0%





**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO





**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



AVANCE FISICO - FINANCIERO

OBRA: "REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, DE LA COLONIA AVIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT.."

No. CONTRATO FAISMUN-URB-OP-2023-012-AD

MONTO DE CONTRATO \$ 818,453.78

AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	100%
POR EJERCER	0%

100%

■ AVANCE ACTUAL ■ POR EJERCER

AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ 818,453.78	100%
POR COBRAR	\$ -	0%

100%

■ EJECUTADO PAGADO ■ POR COBRAR



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



ANDO  
**igo**  
AVANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**contigo**  
ANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



AVANZANDO  
**tigo**  
AVANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



JANDO  
**tigo**  
OS



AVANCE FISICO - FINANCIERO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL BETEL EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE GUAYABITOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT; REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE GENERAL SÓSTENES ROCHA Y CALLE L.G. NAVARRO EN COLONIA ESTADIOS, DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT."


No. CONTRATO FAISMUN-DRE-OP-2023-013-I

MONTO DE CONTRATO \$ 2,703,121.49

AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	100%
POR EJERCER	0%

AVANCE FISICO

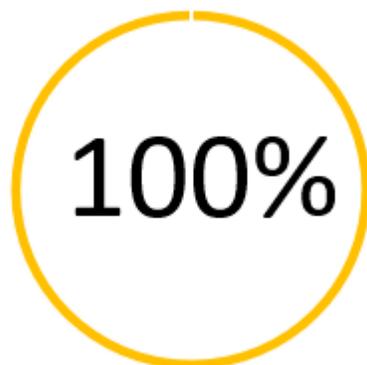


■ AVANCE ACTUAL ■ POR EJERCER

AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ 912,529.14	34%
POR COBRAR	\$ 1,790,592.35	66%

AVANCE FINANCIERO

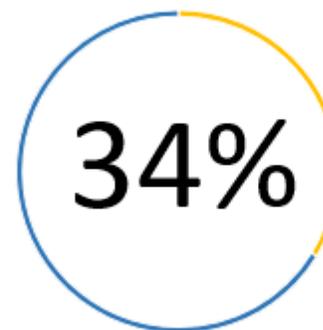

■ EJECUTADO PAGADO ■ POR COBRAR



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO

DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO I MADERO, COMPOSTELA.



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

## REPORTE FOTOGRAFICO

DRENAJE SANITARIO COLONIA EL BETEL, RINCON DE GUAYABITOS.



TRABAJANDO  
**ontigo**  
EN ZAMOS



AVANCE FISICO - FINANCIERO


OBRA: "REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA LAS FUENTES EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT."

No. CONTRATO FAISMUN-URB-OP-2023-014-AD

MONTO DE CONTRATO \$ 1,109,803.76

AVANCE FISICO


AVANCE ACTUAL	95%
POR EJERCER	5%

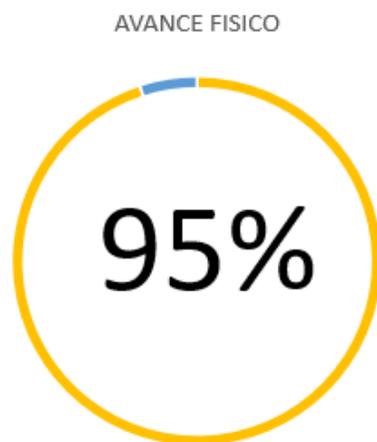

■ AVANCE ACTUAL ■ POR EJERCER

AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ 784,529.13	71%
POR COBRAR	\$ 325,274.63	29%

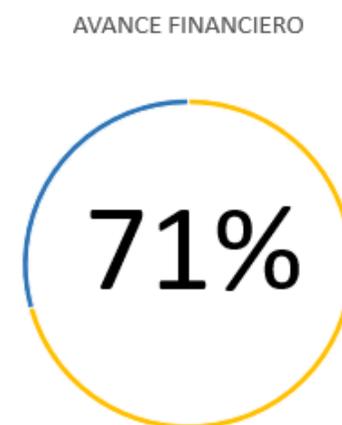

■ EJECUTADO PAGADO ■ POR COBRAR



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO






**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO





**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

**REPORTE FOTOGRAFICO**





AVANCE FISICO - FINANCIERO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y SALIDA A CERRO PELÓN EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT."

No. CONTRATO

FAISMUN-URB-OP-2023-015-I


MONTO DE CONTRATO \$

3,098,597.57

AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	90%
POR EJERCER	10%

AVANCE FISICO

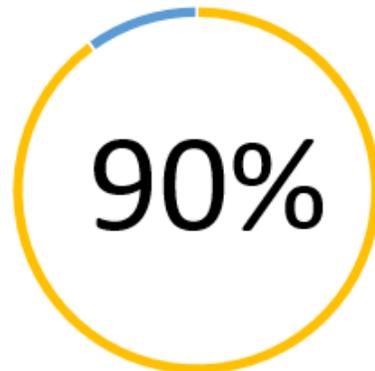


■ AVANCE ACTUAL ■ POR EJERCER

AVANCE FINANCIERO

			%
EJECUTADO PAGADO	\$	2,147,215.18	69%
POR COBRAR	\$	951,382.39	31%

AVANCE FINANCIERO

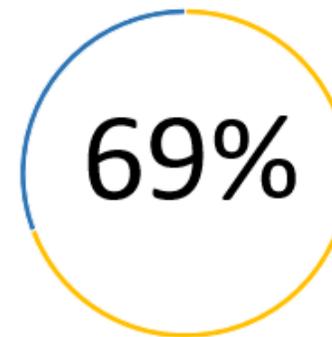

■ EJECUTADO PAGADO ■ POR COBRAR



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO





**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



AVANCE FISICO - FINANCIERO


OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE GENERAL RAFAEL BUELNA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA AGUA AZUL EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT."

No. CONTRATO FAISMUN-URB-OP-2023-016-I

MONTO DE CONTRATO \$ 3,098,597.57

AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	100%
POR EJERCER	0%

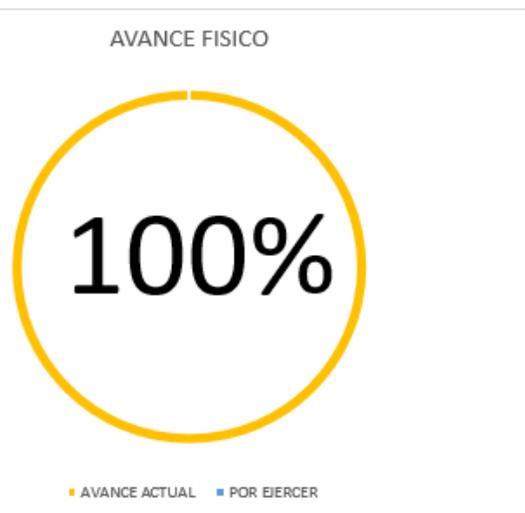

AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ 3,098,597.57	100%
POR COBRAR	\$ -	0%





**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**contigo**  
LANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

**REPORTE FOTOGRAFICO**



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



AVANCE FISICO - FINANCIERO


OBRA: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.."

<b>No. CONTRATO</b>	FAISMUN-APO-OP-2023-017-1	<b>MONTO DE CONTRATO</b>	\$	1,739,381.05
---------------------	---------------------------	--------------------------	----	--------------

AVANCE FISICO

<b>AVANCE ACTUAL</b>	100%
<b>POR EJERCER</b>	0%

AVANCE FISICO

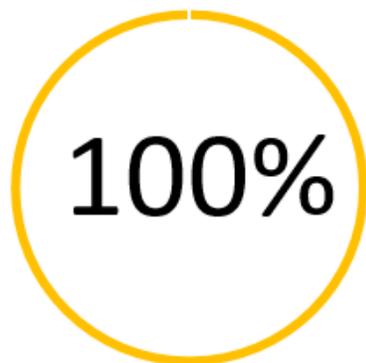


■ AVANCE ACTUAL ■ POR EJERCER

AVANCE FINANCIERO

			%
<b>EJECUTADO PAGADO</b>	\$	1,712,966.33	98%
<b>POR COBRAR</b>	\$	26,414.72	2%

AVANCE FINANCIERO

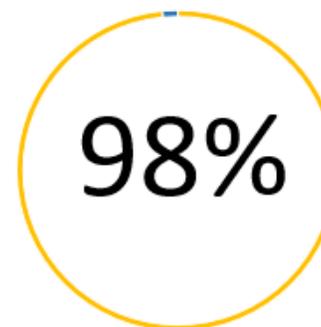

■ EJECUTADO PAGADO ■ POR COBRAR



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**contigo**  
ANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
VANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

**REPORTE FOTOGRAFICO**



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



AVANCE FISICO - FINANCIERO


OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 5 CASETAS DE CLORACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ÚRSULO GALVÁN, MIRAVALLS, LAS PIEDRAS, LA PEÑITA DE JALTEMBA Y ALTAVISTA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT."

No. CONTRATO FAISMUN-APO-OP-2023-018-AD

MONTO DE CONTRATO \$ 870,252.91


AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	100%
POR EJERCER	0%

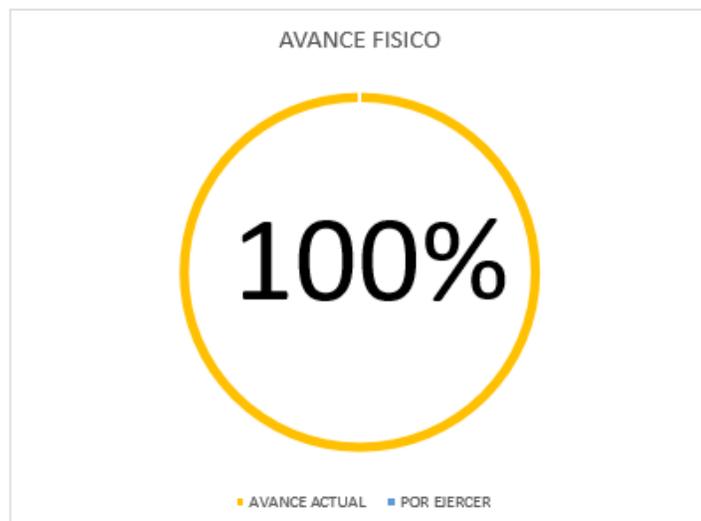

AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ -	0%
POR COBRAR	\$ 870,252.91	100%

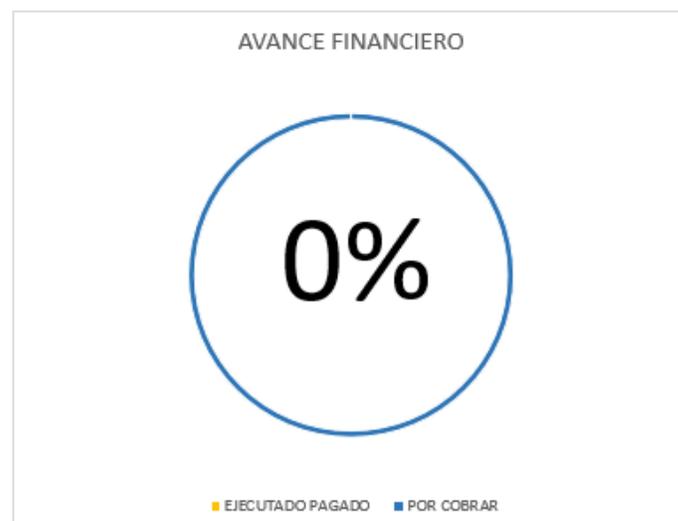



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

## REPORTE FOTOGRAFICO

CASETA ÚRSULO GALVÁN



TRABAJANDO  
**ontigo**  
AVANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO

### CASETA MIRAVALLS



TRABAJANDO  
**ontigo**  
ANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

## REPORTE FOTOGRAFICO

CASETA LAS PIEDRAS



TRABAJANDO  
**ontigo**  
ANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

## REPORTE FOTOGRAFICO

CASETA LA PEÑITA DE JALTEMBA



TRABAJANDO  
**ontigo**  
JUNZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

## REPORTE FOTOGRAFICO

CASETA ALTAVISTA



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



AVANCE FISICO - FINANCIERO


OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT."

No. CONTRATO FAISMUN-URB-OP-2023-019-AD

MONTO DE CONTRATO \$ 445,918.63


AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	100%
POR EJERCER	0%

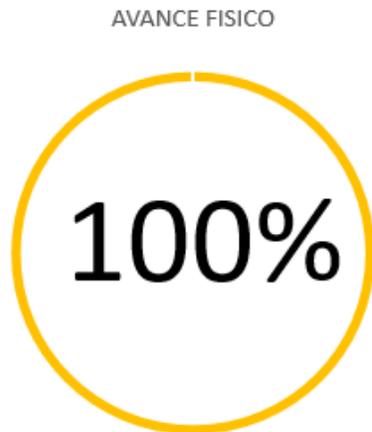

AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ 445,918.63	100%
POR COBRAR	\$ -	0%

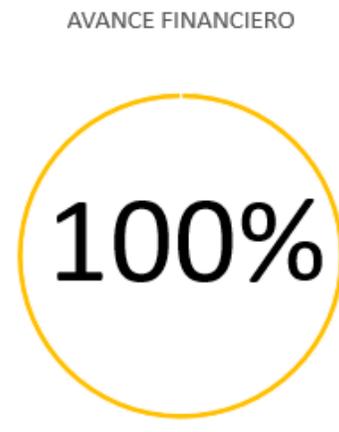



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



AVANCE FISICO - FINANCIERO


OBRA: "REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT."

No. CONTRATO FAISMUN-ELE-OP-2023-020-AD

MONTO DE CONTRATO \$ 532,977.35


AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	0%
POR EJERCER	100%

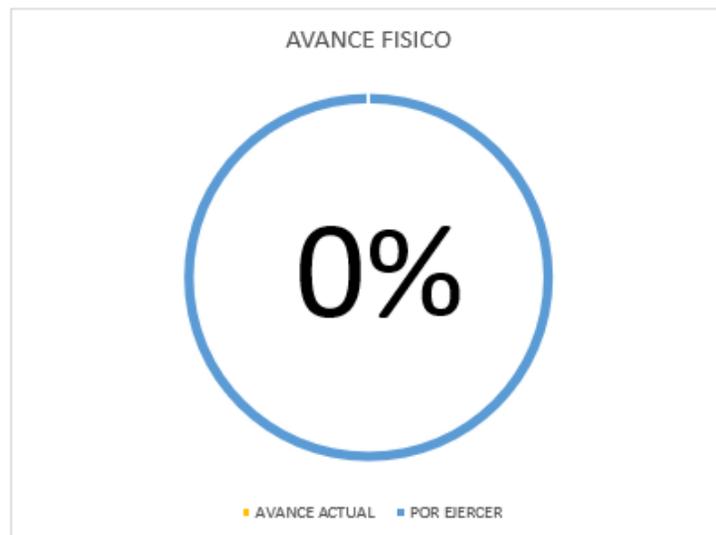

AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ -	0%
POR COBRAR	\$ 532,977.35	100%

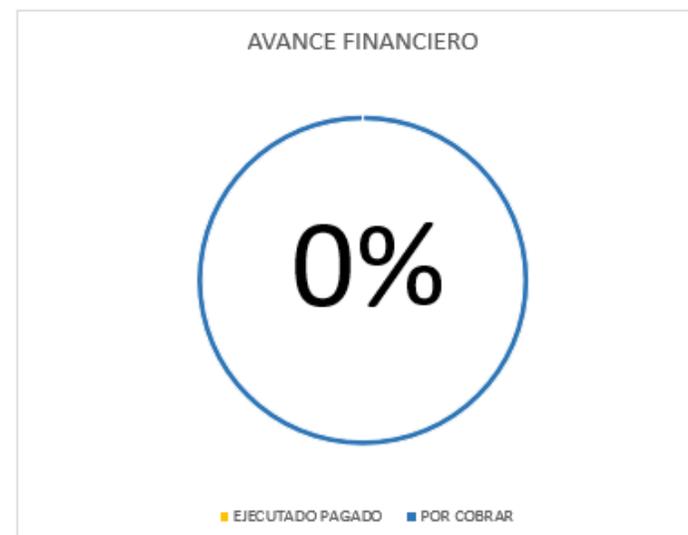



AVANCE FISICO - FINANCIERO


OBRA: "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE DICIEMBRE ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE LAURELES Y GÓNGORA EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN."

No. CONTRATO FAISMUN-DRE-OP-2023-021-I

MONTO DE CONTRATO \$ 1,719,110.89


AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	100%
POR EJERCER	0%

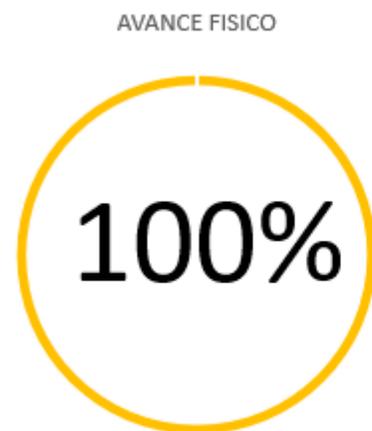

AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ 1,719,110.89	100%
POR COBRAR	\$ -	0%

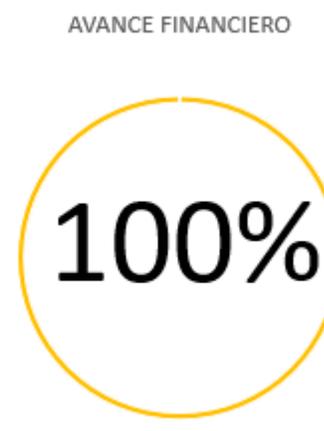



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



LABAJANDO  
**Antigo**  
ZAMOS



AVANCE FISICO - FINANCIERO


OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO ASFALTICO EN CALLE 8 ENTRE HIDALGO Y ALDAMA, CALLE 7 ENTRE HIDALGO Y ZARAGOZA, CALLE LEANDRO VALLE ENTRE ZARAGOZA Y ALDAMA, CALLE ALDAMA ENTRE MINA Y BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA."

No. CONTRATO FAISMUN-URB-OP-2023-022-I

MONTO DE CONTRATO \$ 3,137,021.73


AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	50%
POR EJERCER	50%

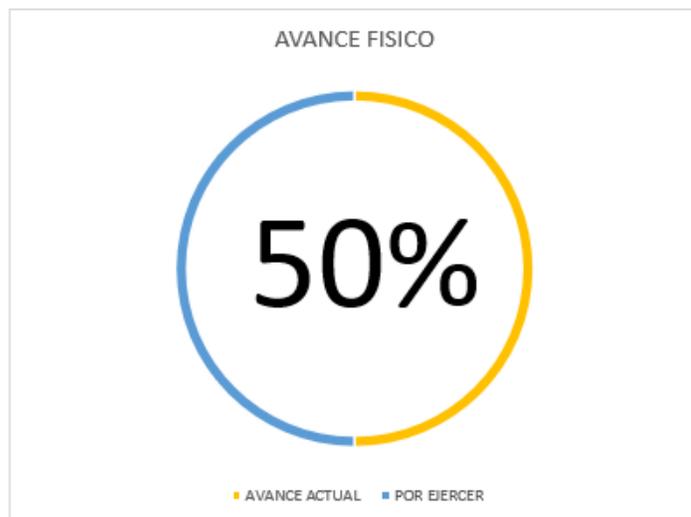

AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ -	0%
POR COBRAR	\$ 3,137,021.73	100%

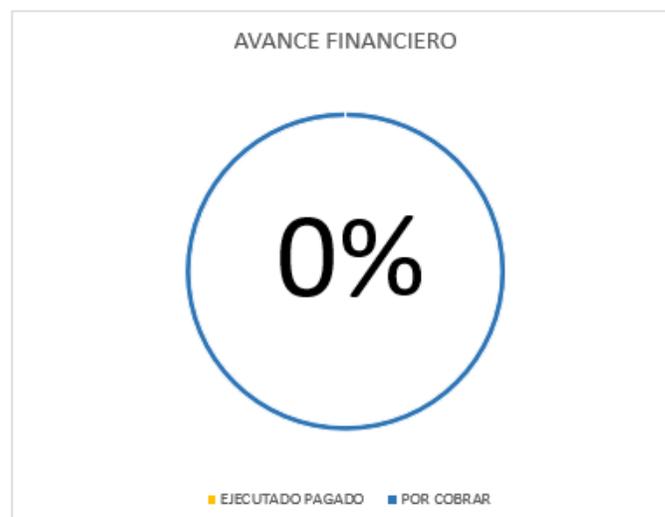



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO





**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
VANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

**REPORTE FOTOGRAFICO**





**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO





AVANCE FISICO - FINANCIERO


OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MONTERREY ENTRE TULE Y FRANCISCO I MADERO, CHIHUAHUA ENTRE HIGUERAS Y TULE, AMAPA ENTRE HIGUERAS Y TULE, TULE ENTRE OCEANO PACIFICO Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, EBANO ENTRE OCEANO PACIFICO Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, LAZARO CARDENAS ENTRE MONTERREY Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, FRANCISCO I MADERO ENTRE OCEANO PACIFICO Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO."

No. CONTRATO FAISMUN-DRE-OP-2023-023-I

MONTO DE CONTRATO \$ 3,150,778.30


AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	63%
POR EJERCER	37%

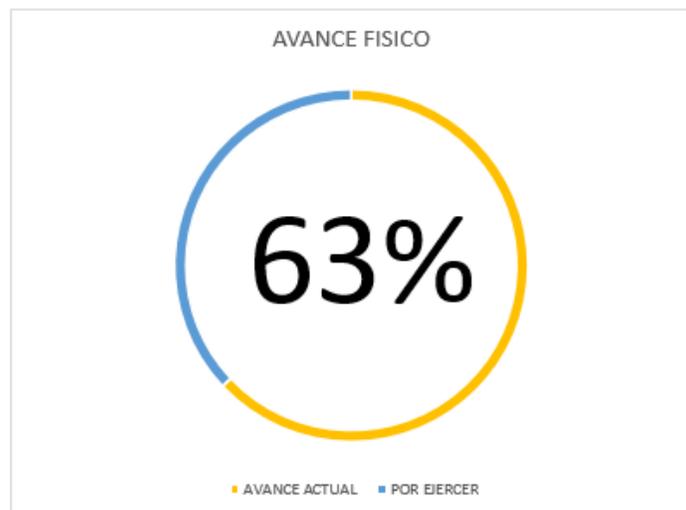

AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ -	0%
POR COBRAR	\$ 3,150,778.30	100%

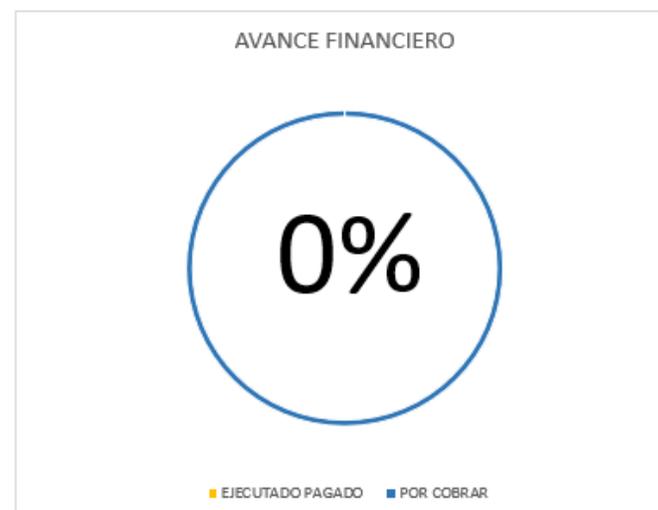



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO





**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



AVANCE FISICO - FINANCIERO


OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MICHOACAN ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE INDUSTRIAL EN COLONIA SAN JOSÉ DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT."

No. CONTRATO FAISMUN-URB-OP-2023-024-AD

MONTO DE CONTRATO \$ 1,277,391.01


AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	95%
POR EJERCER	5%

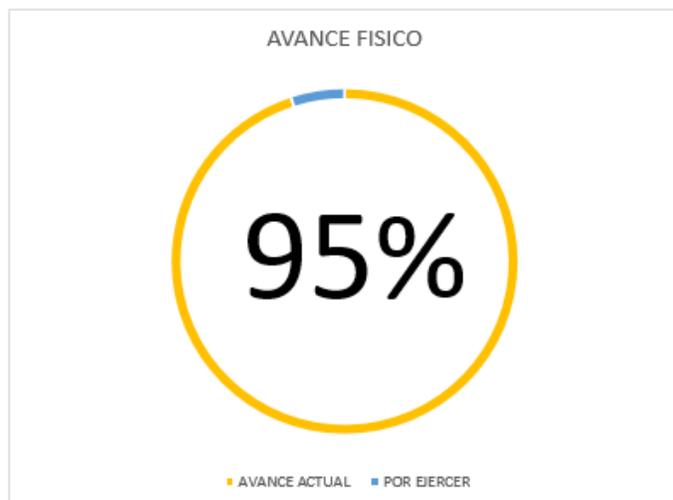

AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ 1,088,803.99	85%
POR COBRAR	\$ 188,587.02	15%

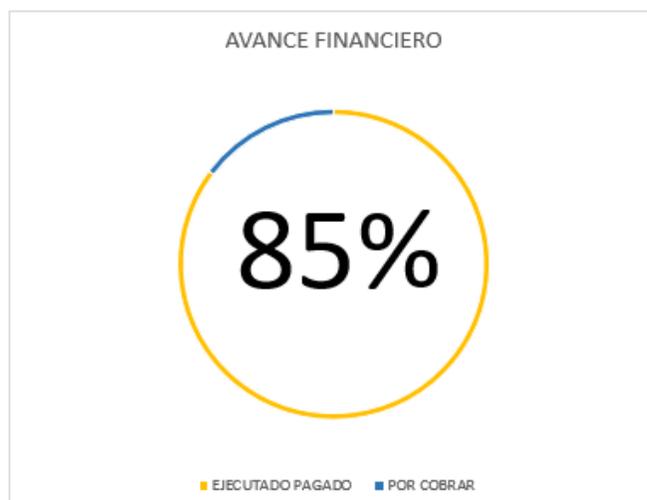



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

**REPORTE FOTOGRAFICO**



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



AVANCE FISICO - FINANCIERO


OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE LÁZARO CARDENAS BAJADA AL ARROYO PARA PASAR A LA COLONIA LAS BORREGAS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA."

No. CONTRATO FAISMUN-URB-OP-2023-025-AD

MONTO DE CONTRATO \$ 299,423.14



AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	45%
POR EJERCER	55%

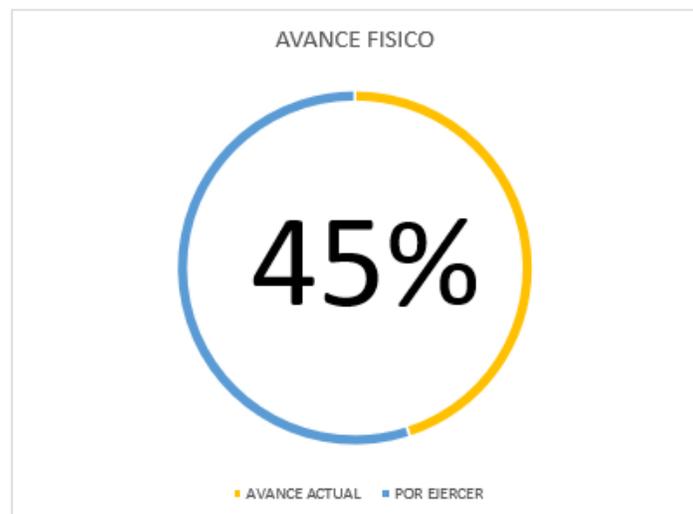

AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ -	0%
POR COBRAR	\$ 299,423.14	100%

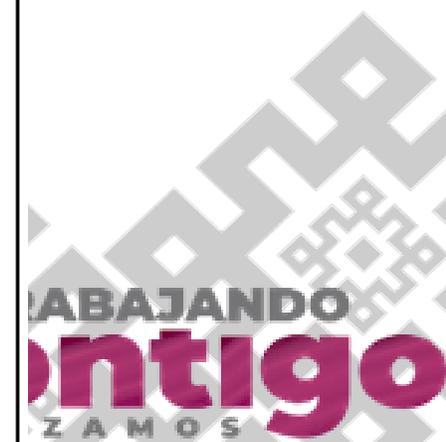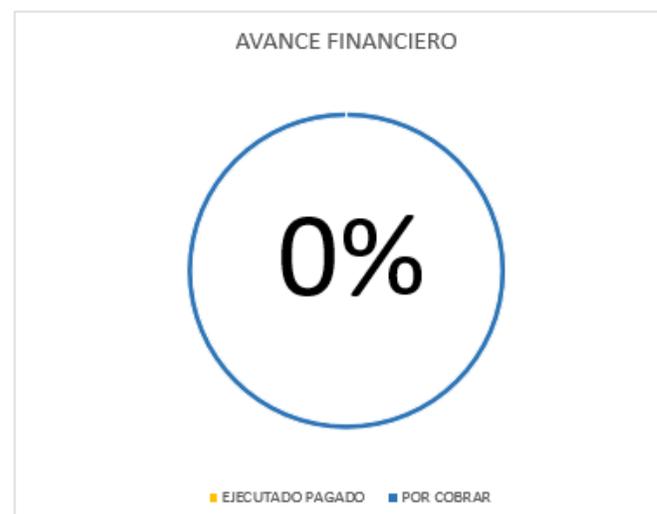



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS



**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO  
**Contigo**  
AVANZAMOS
