



**PRIMER Y SEGUNDO
INFORME TRIMESTRAL**

ENERO A JUNIO 2023

COMPOSTELA

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

H. XLI AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



A la dirección de obras públicas, le corresponde programar, ejecutar y supervisar las obras por contrato en apego a la normatividad, lineamientos y disposiciones legales aplicables en la materia.

Para ello contamos con dos departamentos:

Departamento de Licitaciones y Contrato. Corresponde llevar a cabo los procesos de licitación de obra pública, con estricto apego a las normas aplicables y elaborar e integrar el Padrón de Contratistas

Departamento de Supervisión. Verifica físicamente los avances de obras públicas, rinde informes y lleva el control financiero de las obras.

Durante el periodo Enero a Junio 2023 se elaboraron 9 contratos de obras, por parte del departamento de Licitaciones, y se realizaron 108 visitas al lugar de los trabajos

Los contratos ejecutados en el periodo son:



COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

**PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUALES
(PROSANEAR)**

No	OBRA	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (INC. I.V.A.)	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA
1	AMPLIACIÓN DE EMISOR A PRESIÓN, DE CÁRCAMO DE BOMBEO A PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS AYALA.	PROSANEAR-ALC-OP-2023-001-I	\$ 3'141,489.73	LOS AYALA	EMISOR A PRESIÓN

TRABAJANDO
Contigo
AVANZAMOS



AVANCE FISICO - FINANCIERO


OBRA: "AMPLIACIÓN DE EMISOR A PRESIÓN, DE CÁRCAMO DE BOMBEO A PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS AYALA."

No. CONTRATO PROSANEAR-ALC-OP-2023-001-I

MONTO DE CONTRATO \$ 3,141,489.73

AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	95%
POR EJERCER	5%

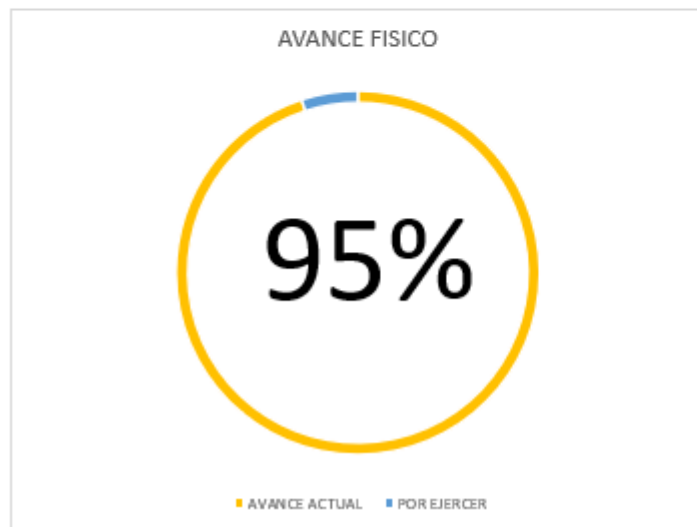

AVANCE FINANCIERO

			%
EJECUTADO PAGADO	\$	3,141,489.73	100%
POR COBRAR	\$	-	0%





COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO



Contigo
AVANZAMOS



**PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHO
(PRODDER)**

No	OBRA	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (INC. I.V.A.)	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA
2	REHABILITACIÓN DE 307 ML DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO PARA 28 TOMAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACIÓN DE 205 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO PARA 22 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE LIRIO ENTRE AVENIDA GUAYABITOS Y AVENIDA SOL NUEVO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUAYABITOS.	PRODDER-ALC-OP-2023-002-I	\$ 1'837,590.23	RINCON DE GUAYABITOS	RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO



AVANCE FISICO - FINANCIERO

OBRA: "REHABILITACIÓN DE 307 ML DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO PARA 28 TOMAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACIÓN DE 205 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO PARA 22 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE LIRIO ENTRE AVENIDA GUAYABITOS Y AVENIDA SOL NUEVO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUAYABITOS."


No. CONTRATO PRODDER-ALC-OP-2023-002-I

MONTO DE CONTRATO \$ 1,837,590.23

AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	90%
POR EJERCER	10%

AVANCE FISICO

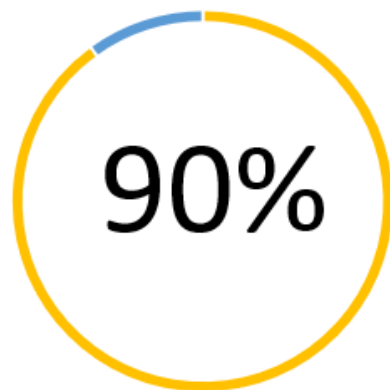

■ AVANCE ACTUAL ■ POR EJERCER

AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ 1,837,590.23	100%
POR COBRAR	\$ -	0%

AVANCE FINANCIERO



■ EJECUTADO PAGADO ■ POR COBRAR



COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO



AVANZAMOS





COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO





COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO



ABAJANDO
ontigo
ZAMOS



**RAMO GENERAL 23
PROVISIONES SALARIAS Y ECONÓMICAS**

No	OBRA	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (INC. I.V.A.)	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA
3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE SONORA EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	PSE-REVUPE-OP-2023-003-I	\$ 3'609,725.65	LAS VARAS	EMPEDRADO AHOGADO



AVANCE FISICO - FINANCIERO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE SONORA EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT."

No. CONTRATO PSE-REVUPE-OP-2023-003-I

MONTO DE CONTRATO \$ 3,609,725.65


AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	100%
POR EJERCER	0%



AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ 3,532,335.59	98%
POR COBRAR	\$ 77,390.06	2%

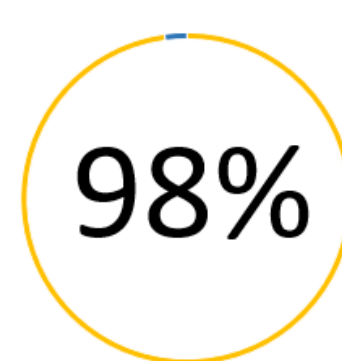



COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO






COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

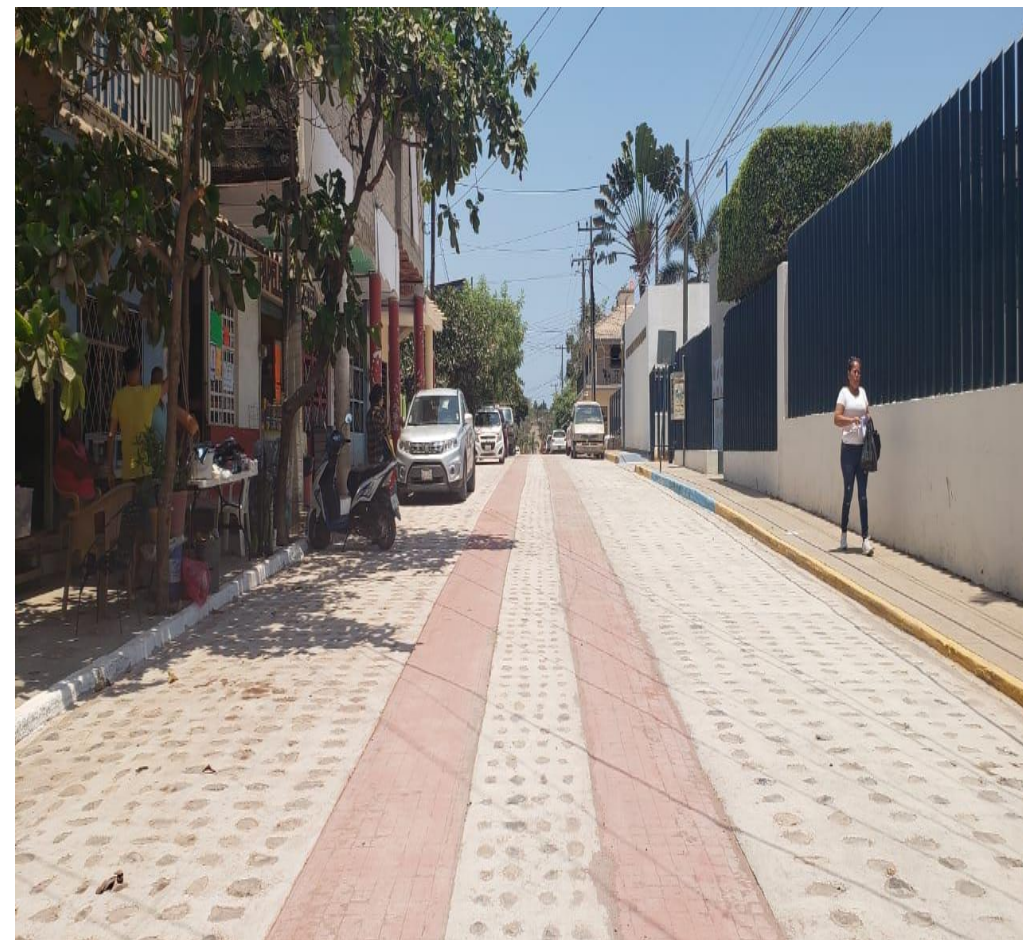



**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FAISMUN)**

No	OBRA	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (INC. I.V.A.)	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA
4	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	FAISMUN-APO-OP-2023-004-AD	\$ 1'503,172.64	SAN ISIDRO	AGUA POTABLE
5	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO Y PUENTE VEHICULAR A PANTEÓN REGIONAL DE LA LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA	FAISMUN-URB-OP-2023-005-I	\$ 2'574,683.95	BELLA UNIÓN	PUENTE VEHICULAR
6	REHABILITACIONES DE CANCHAS PÚBLICAS DE FUTBOL RÁPIDO EN LAS LOCALIDADES DE LAS VARAS, FELIPE CARRILLO PUERTO Y COMPOSTELA, NAYARIT.	FAISMUN-URB-OP-2023-006-I	\$ 1'995,227.62	LAS VARAS, COMPOSTELA, FELIPE CARRILO PUERTO	CANCHA DE FUTBOL
7	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES, EN BARRIO ATENAS DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS.	FAISMUN-URB-OP-2023-007-I	\$ 4'194,105.64	LAS VARAS	CANCHA USOS MÚLTIPLES
8	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IXTLÁN LAS CAÑADAS.	FAISMUN-SALUD-OP-2023-008-AD	\$ 694,474.57	NUEVO IXTLAN (LAS CAÑADAS)	DISPENSARIO MEDICO
9	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE TEPIQUEÑOS	FAISMUN-URB-OP-2023-009-I	\$ 2'590,977.62	TEPIQUEÑOS	PLAZA CIVICA



AVANCE FISICO - FINANCIERO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT."

No. CONTRATO


FAISMUN-APO-OP-2023-004-AD

MONTO DE CONTRATO \$

1,503,172.64

AVANCE FISICO


AVANCE ACTUAL	72%
POR EJERCER	28%

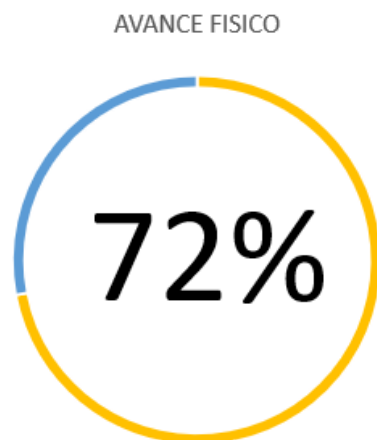

■ AVANCE ACTUAL ■ POR EJERCER

AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ 876,839.05	58%
POR COBRAR	\$ 626,333.59	42%

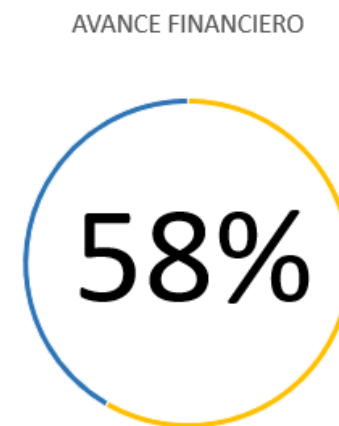

■ EJECUTADO PAGADO ■ POR COBRAR



COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO





COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJANDO
Contigo
AVANZAMOS



COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO





AVANCE FISICO - FINANCIERO


OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO Y PUENTE VEHICULAR A PANTEÓN REGIONAL DE LA LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA."

No. CONTRATO FAISMUN-URB-OP-2023-005-I

MONTO DE CONTRATO \$ 2,574,683.95


AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	95%
POR EJERCER	5%

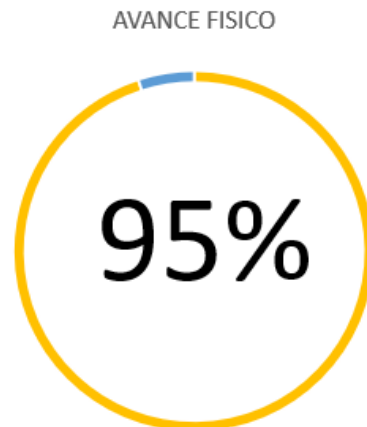

AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ 2,261,942.62	88%
POR COBRAR	\$ 312,741.33	12%

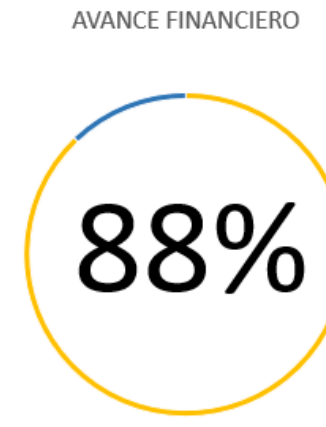



COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO





COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO





AVANCE FISICO - FINANCIERO

OBRA: "REHABILITACIONES DE CANCHAS PÚBLICAS DE FUTBOL RÁPIDO EN LAS LOCALIDADES DE LAS VARAS, FELIPE CARRILLO PUERTO Y COMPOSTELA, NAYARIT."


No. CONTRATO FAISMUN-URB-OP-2023-006-I

MONTO DE CONTRATO \$ 1,995,227.62

AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	41%
POR EJERCER	59%

AVANCE FISICO

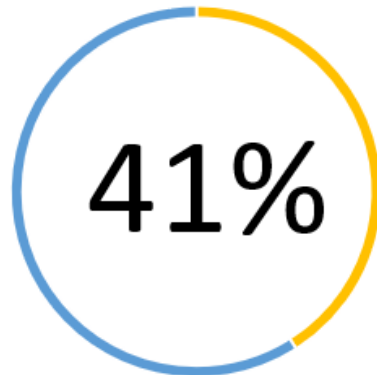


■ AVANCE ACTUAL ■ POR EJERCER

AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ -	0%
POR COBRAR	\$ 1,995,227.62	100%

AVANCE FINANCIERO



■ EJECUTADO PAGADO ■ POR COBRAR



COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

REHABILITACIÓN DE CANCHA COL. CELSO HERNANDEZ, LAS VARAS.



TRABAJANDO
Contigo
AVANZAMOS



COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

REHABILITACIÓN DE CANCHA UNIDAD DEPORTIVA, COMPOSTELA.



Contigo
AVANZAMOS



AVANCE FISICO - FINANCIERO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLES, EN BARRIO ATENAS DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS."

No. CONTRATO	FAISMUN-URB-OP-2023-007-I
---------------------	---------------------------

MONTO DE CONTRATO	\$	4,194,105.64
--------------------------	----	--------------


AVANCE FISICO

AVANCE ACTUAL	36%
POR EJERCER	64%

AVANCE FINANCIERO


		%
EJECUTADO PAGADO	\$ 1,290,495.06	31%
POR COBRAR	\$ 2,903,610.58	69%

AVANCE FISICO

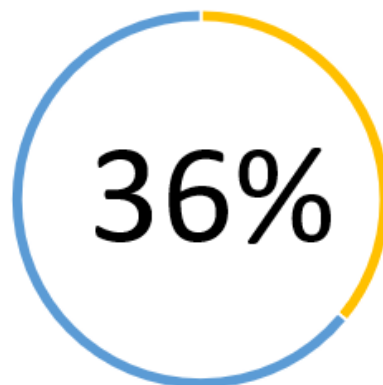

■ AVANCE ACTUAL ■ POR EJERCER

AVANCE FINANCIERO

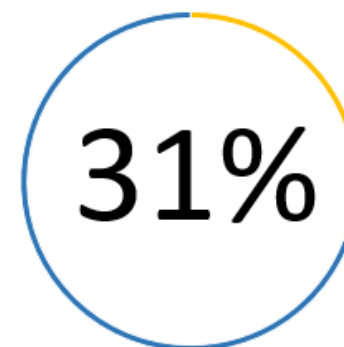

■ EJECUTADO PAGADO ■ POR COBRAR



COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO





COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO



BAJANDO
ntigo
AMOS



AVANCE FISICO - FINANCIERO


OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IXTLÁN LAS CAÑADAS."

No. CONTRATO FAISMUN-SALUD-OP-2023-008-AD

MONTO DE CONTRATO \$ 694,474.57

AVANCE FISICO


AVANCE ACTUAL	90%
POR EJERCER	10%

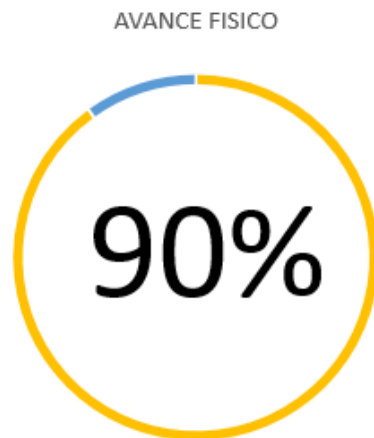

AVANCE ACTUAL POR EJERCER

AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ 321,537.35	46%
POR COBRAR	\$ 372,937.22	54%

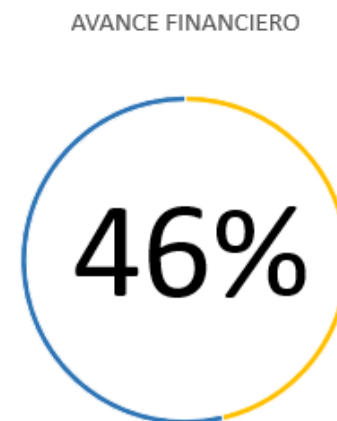

EJECUTADO PAGADO POR COBRAR



COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO





COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO



BAJANDO
ntigo
AMOS



AVANCE FISICO - FINANCIERO


OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE TEPIQUEÑOS."

No. CONTRATO FAISMUN-URB-OP-2023-009-I

MONTO DE CONTRATO \$ 2,590,977.62

AVANCE FISICO


AVANCE ACTUAL	30%
POR EJERCER	70%

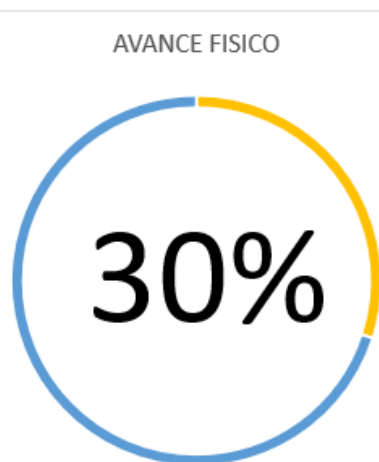

■ AVANCE ACTUAL ■ POR EJERCER

AVANCE FINANCIERO

		%
EJECUTADO PAGADO	\$ -	0%
POR COBRAR	\$ 2,590,977.62	100%

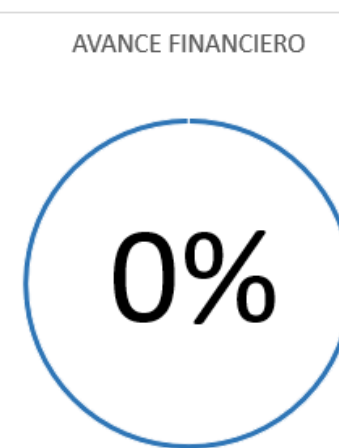

■ EJECUTADO PAGADO ■ POR COBRAR



COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO





COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO





COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

